



令和元年9月（2019年9月）の工事状況 9月25日撮影

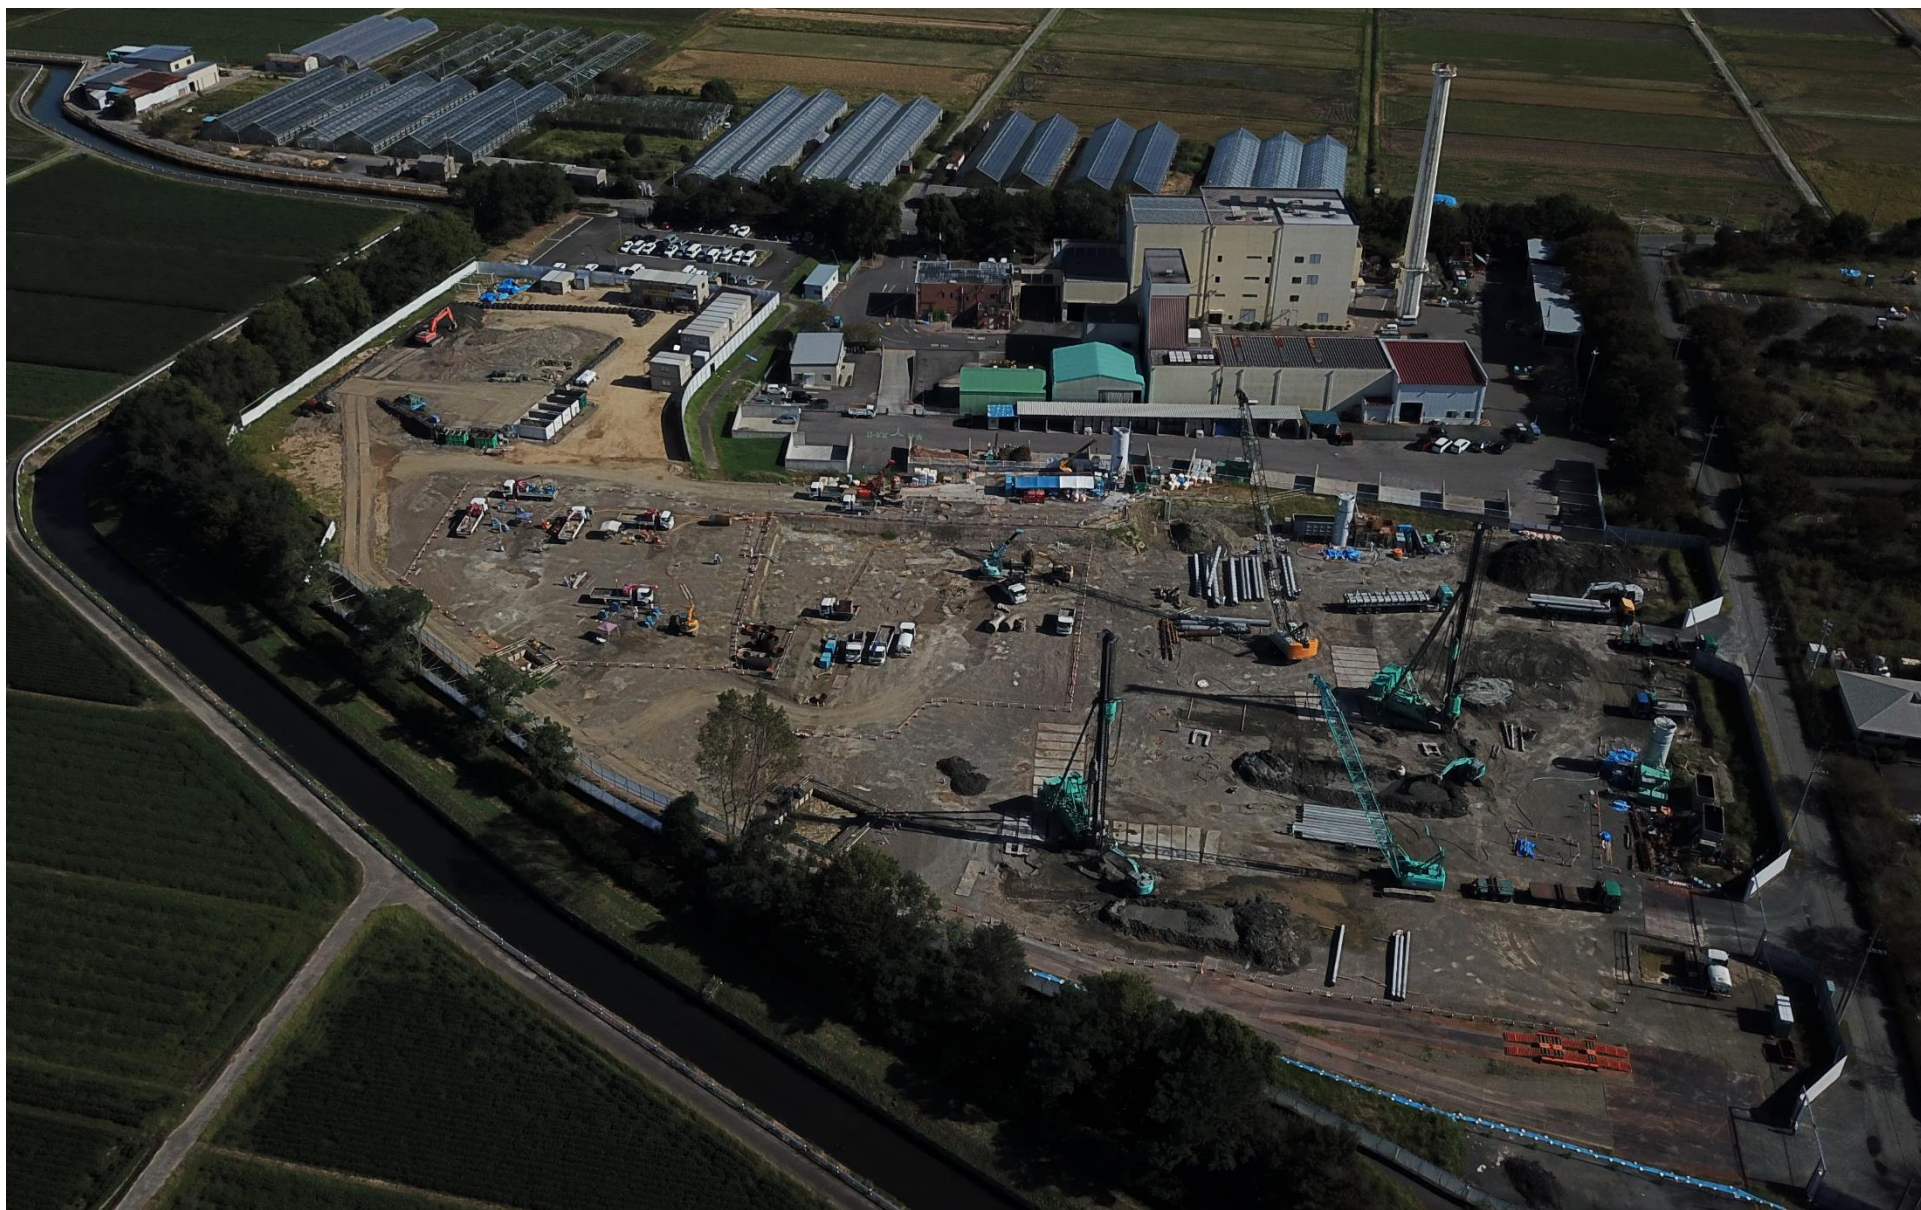

【9月の主な工事内容】

(1) 地盤改良工事

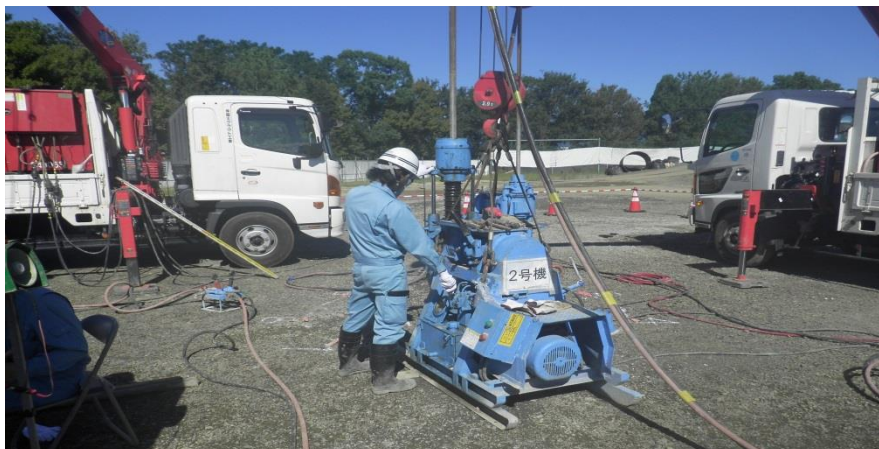

地盤改良工事は9月末で、270箇所/270箇所完了しました。

(2) ケーシング打設



引き続き、ケーシング打設を行っており、9月末で180箇所/270箇所を完了しました。

(3) 杭搬入



(4) 杭打設 [全景]



杭打設を9月から行っています。

【9月の主な工事内容】

(5) 杭打設 [ボーリング]



まずは、先行ボーリングを行い、杭根固め液や杭周充填液を流し込みます。

(6) 杭打設 [杭建て込み]



先行ボーリング箇所に、大型クレーンで、杭を入れています。
杭は1ヶ所当たり、4本の杭を繋ぎ、深度は41m。また、杭の直径は、 $\phi 450$ ～ $\phi 1000$ です。

(7) 杭打設 [杭接続]



杭と杭を繋ぐ作業をしています。

(8) 杭打設 [完了]



杭打設は9月末で、90箇所/270箇所完了しました。

※上記の(5)から(8)までが杭打設の工程になります。
