

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成30年2月26日

計画の名称	1 守山市における下水道接続の推進と浸水対策の推進		
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	滋賀県守山市
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好で住みやすい環境を創造する。		

計画の成果目標（定量的指標）	・（汚水）当計画の最終年度で下水道処理人口普及率を93.6%まで向上させる。		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)							
下水道処理人口普及率（%） = 下水道処理区域内人口（人） / 行政区域内人口（77,171人）	93.4%	93.5%	93.6%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	278 百万円	A	278 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
守山市下水道事業評価委員会において、当計画の事業実施状況、指標の達成状況の報告・確認を実施	平成30年2月15日
	公表の方法
	守山市ホームページにて公表する。

1. 交付対象事業の進捗状況 上段：計画値  
下段：実績

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	下水道	一般	守山市	直接	-	汚水	新設	湖南中部処理区関連 汚水管の整備	汚水管φ75～300 L=6400m 汚水管φ75～300 L=5289m	守山市						300	
																273	
1-A1-7	下水道	一般	守山市	直接	-	汚水	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し 施設計画の見直し	守山市						20	
																5	
1-A1-8	下水道	一般	守山市	直接	-	雨水	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し 施設計画の見直し	守山市						30	
																0	
											合計	350					
												278					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
											合計	0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
合計													0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・下水道処理人口普及率が93.4%から94.1%に向上し、生活環境の向上を図ることができた。													
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値	93.60%	目標値と実績値 に差が出た要因	最終目標値の93.6%を0.5%上回った。要因として公共下水道整備済みの区域で人口増加があったことから実績値に差が出た。										
		最終実績値	94.10%												
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因											
		最終実績値													
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因											
		最終実績値													
	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因												
	最終実績値														
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)															

3. 特記事項（今後の方針等）

・下水道管の新設を行い、公共用水域の水質が向上、快適な暮らしの実現、良好で住みやすい環境を整備できるよう施設整備を継続的にを行います。														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

計画の名称	1 守山市における下水道接続の推進と浸水対策の推進		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	滋賀県守山市


番号	要素となる事業名	事業内容
1-A1-1	湖南中部処理区関連 污水管の整備	污水管φ 75~300 L=6400m
1-A1-7	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し

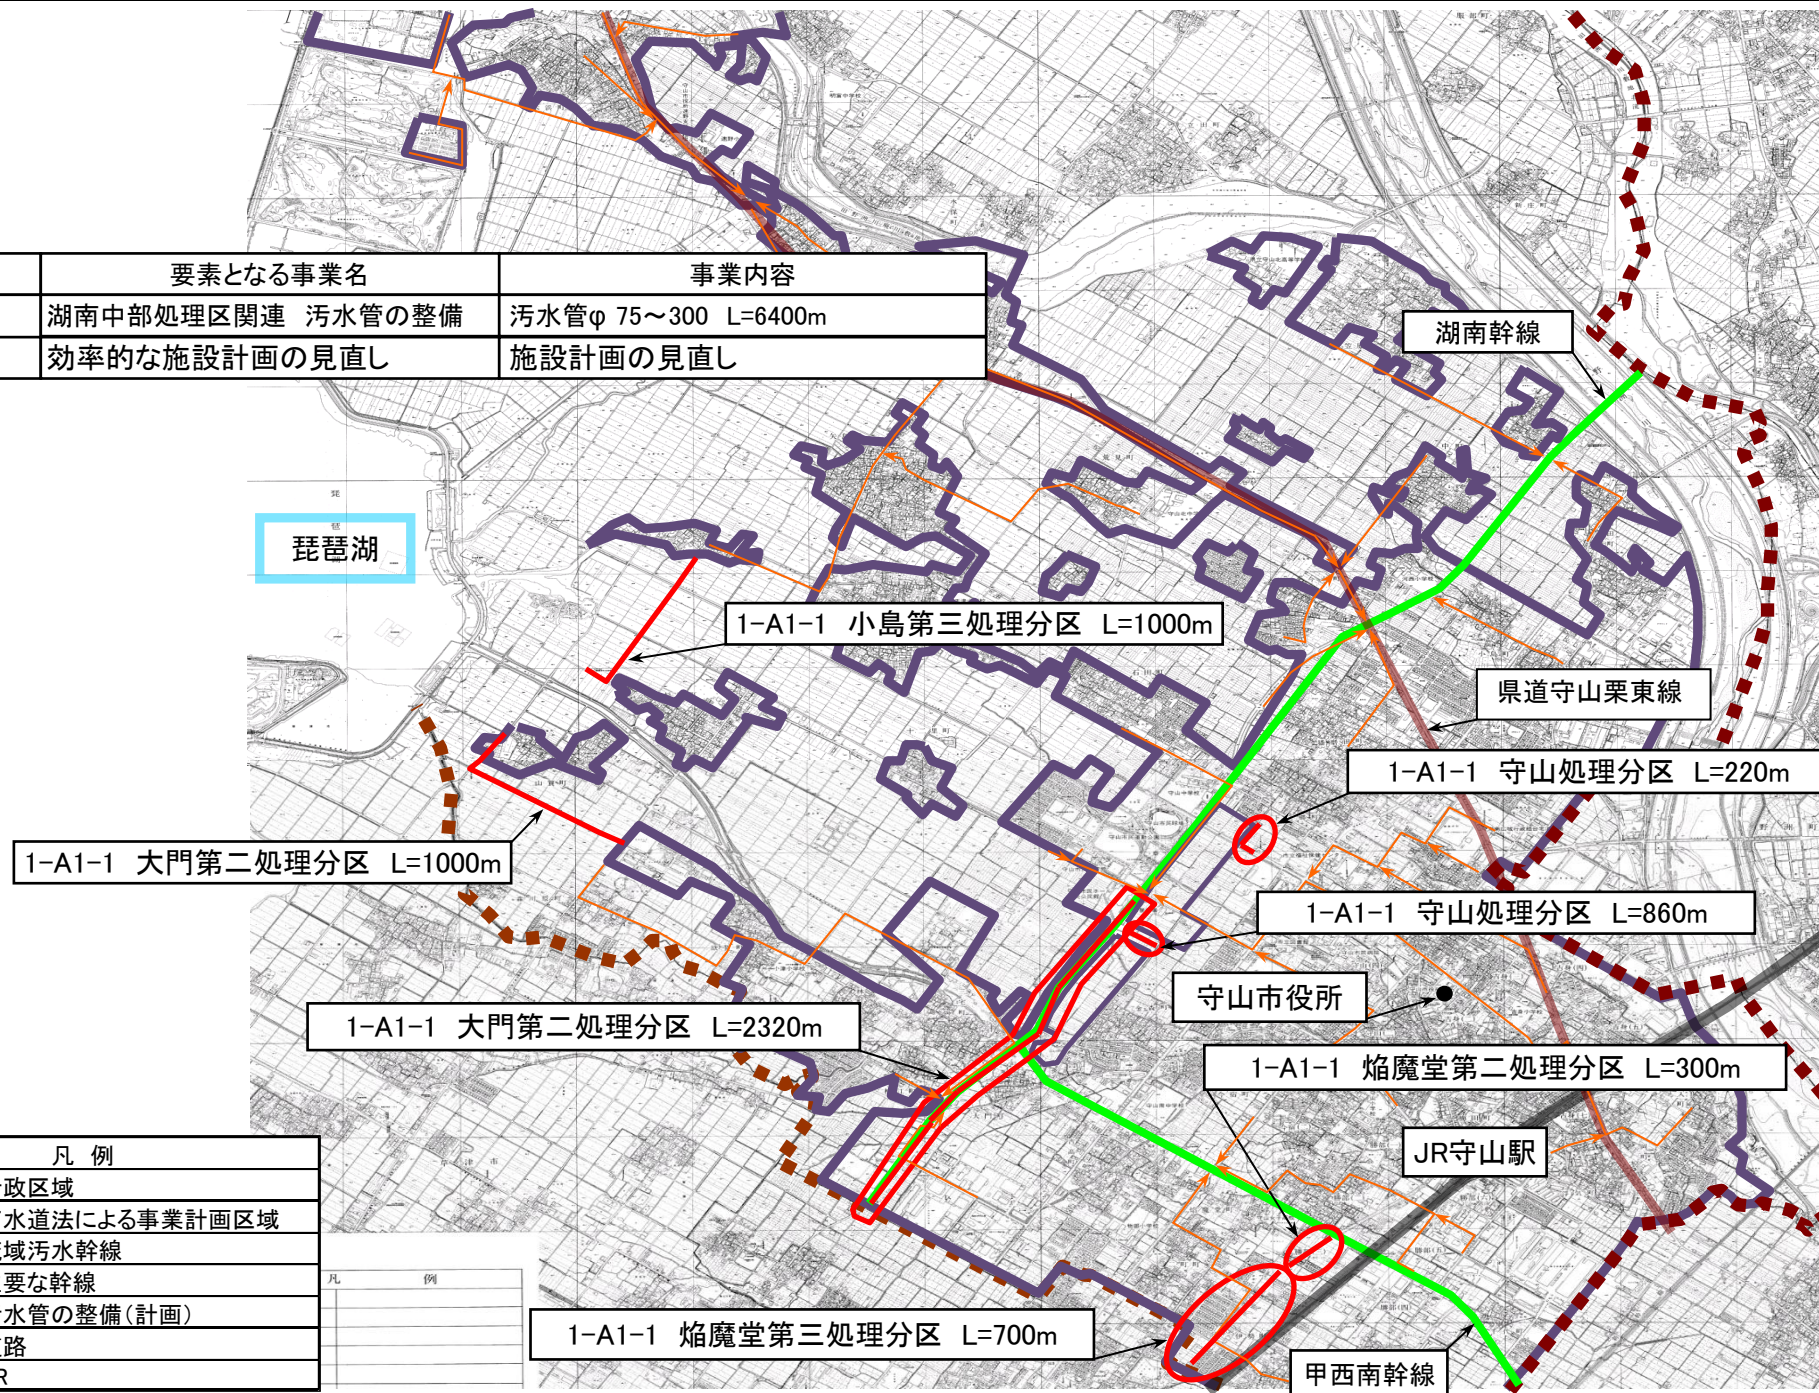

凡例	
	行政区域
	下水道法による事業計画区域
	流域污水幹線
	主要な幹線
	污水管の整備(計画)
	道路
	JR

計画の名称	1 守山市における下水道接続の推進と浸水対策の推進		交付対象	守山市
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)			

番号	要素となる事業名	事業内容
1-A1-8	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し

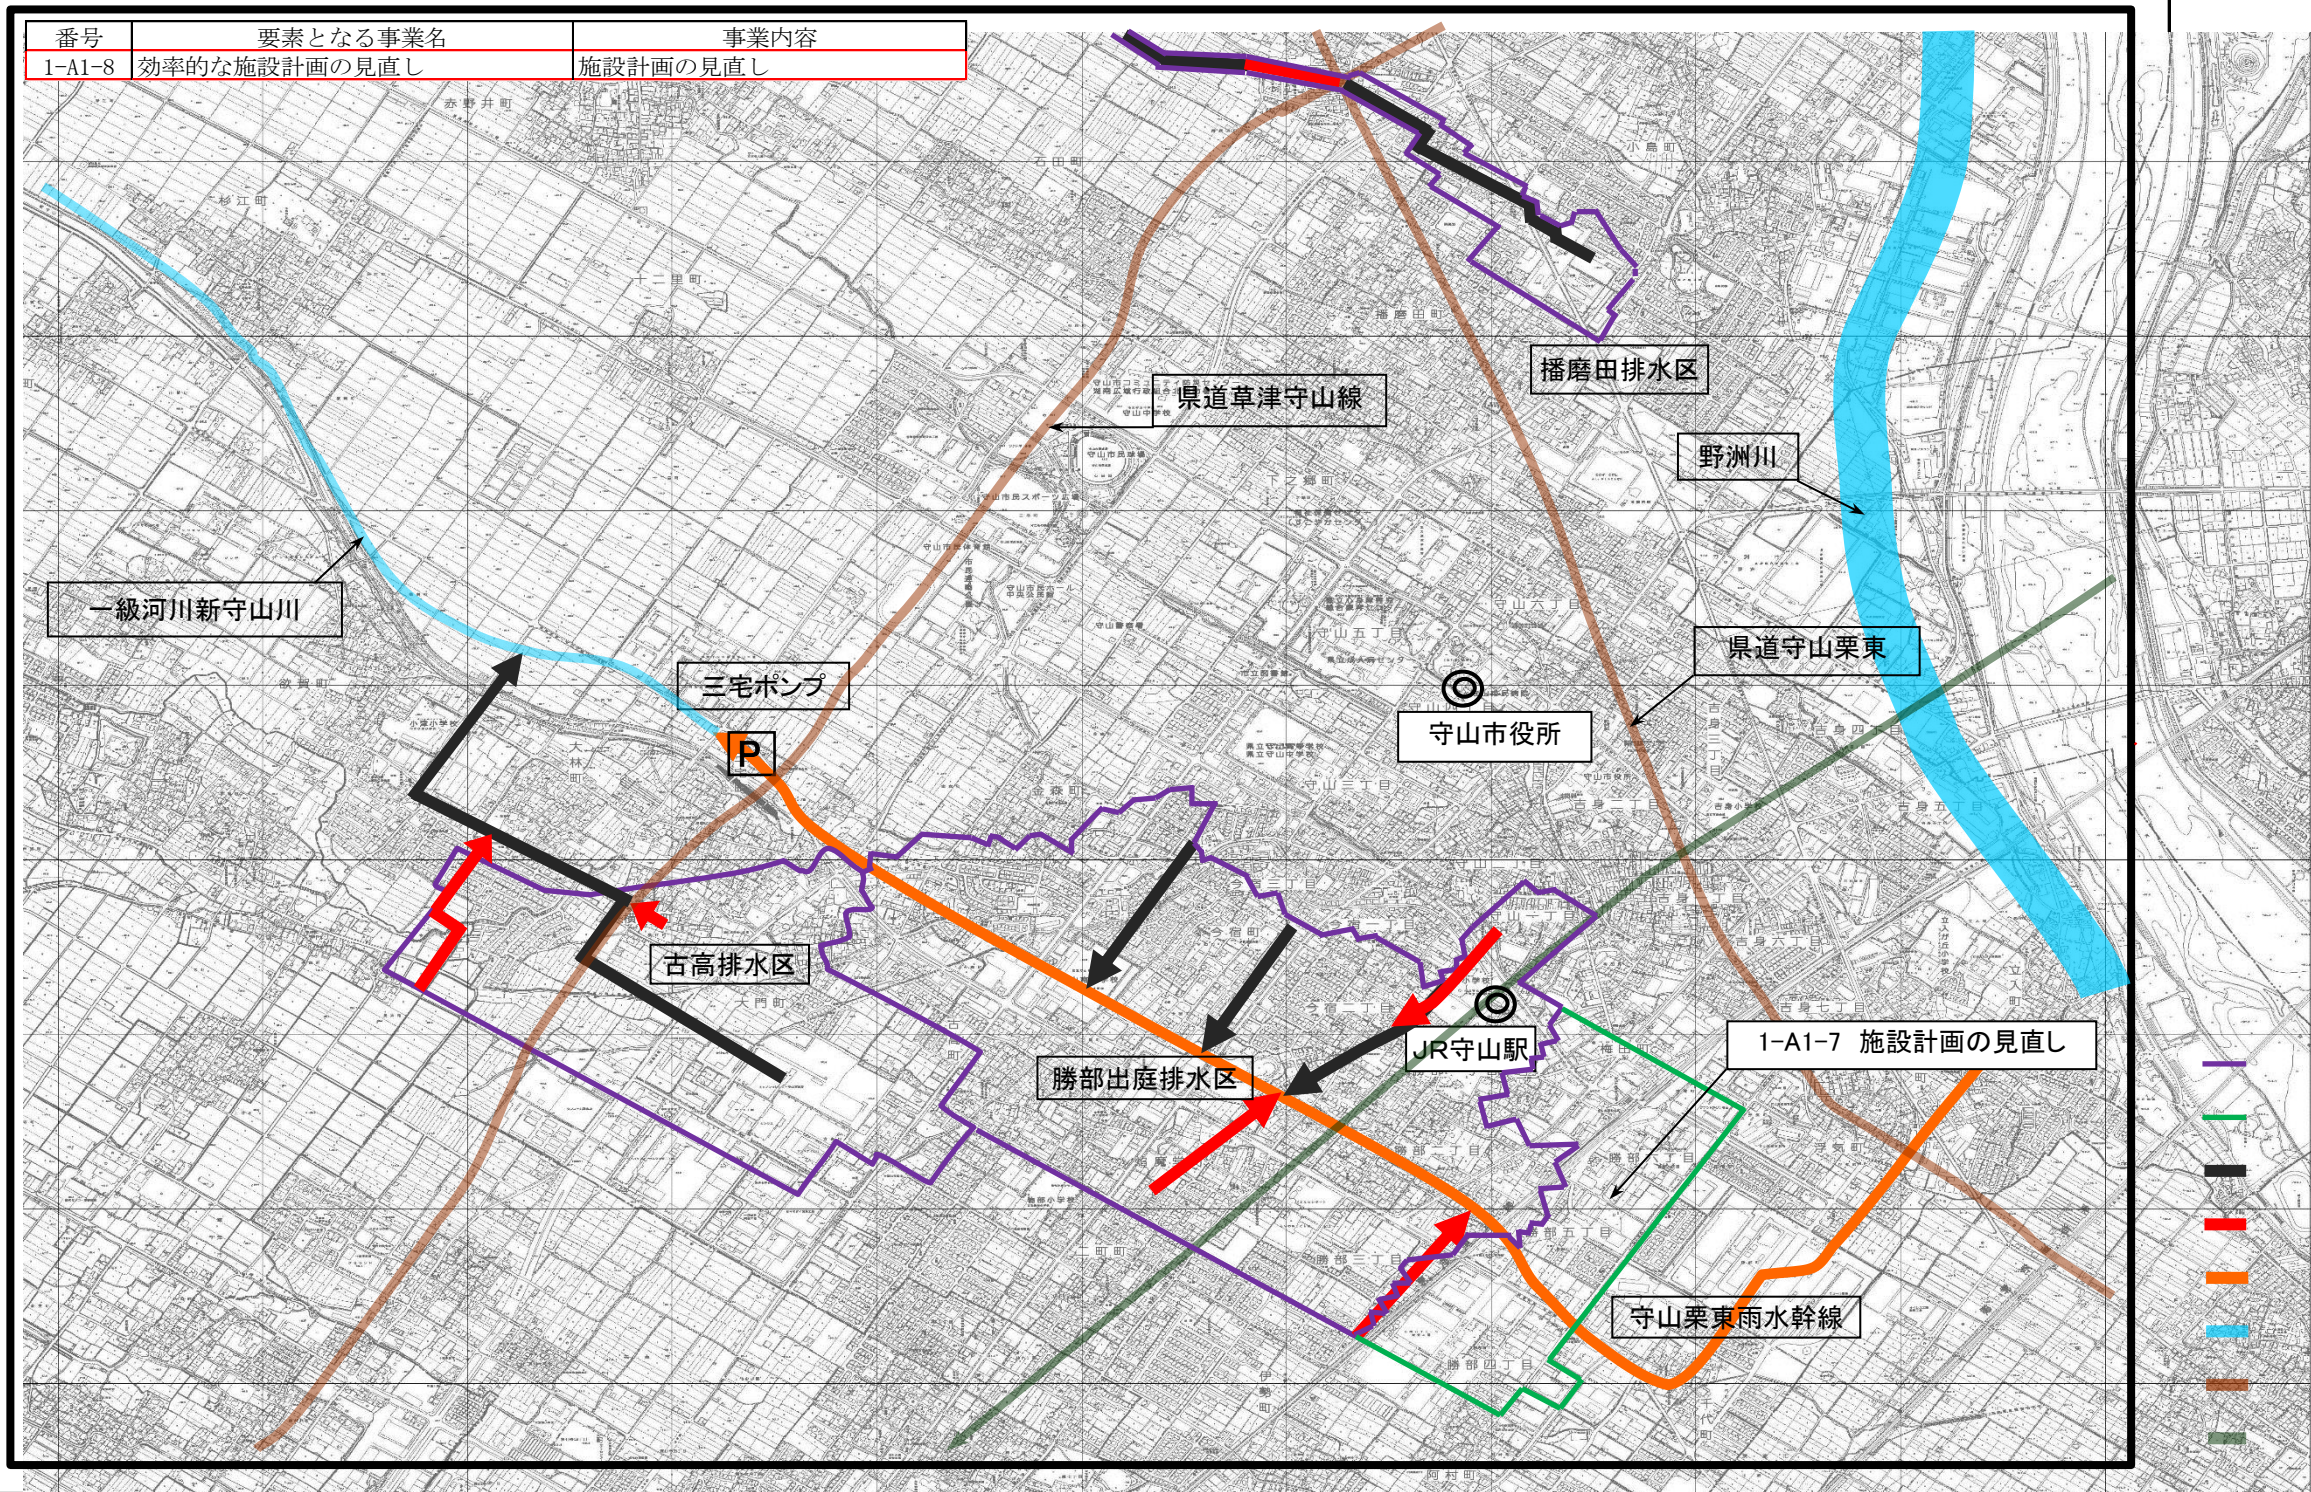

例	
	水道法による事業計画区域
	下水道法による計画区域(見直し)
	幹線(整備済み)
	事業(雨水幹線)
	山栗東雨水幹線
	河川
	道路
	JR
