

令和2年4月（2020年4月）の工事状況 4月22日撮影






## 【4月の主な工事内容】

(1) リサイクル施設：1階土間コンクリート打設後



プラットホーム入口側からの状況です。

(2) リサイクル施設：壁配筋施工後

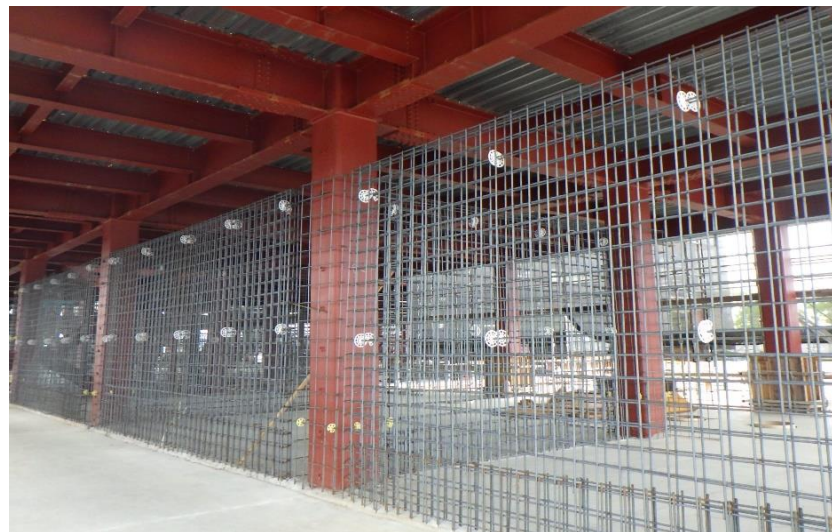

(3) 熱回収施設：1階 ALC 施工後（タービン発電機室）



(4) 熱回収施設：ランプウェイ型枠施工後





## 【4月の主な工事内容】

(5) 熱回収施設：ごみピット底盤コンクリート打設後



中央の鉄骨から右側が受入ピット、左側が貯留ピットの2段ピットとなります。

(6) 熱回収施設：ボイラ下部管寄せ溶接中



(7) 熱回収施設：ろ過式集じん器据付中



焼却飛灰を集じん器で捕集します。

(8) 熱回収施設：飛灰貯留槽据付中



集じん器で捕集した飛灰を貯留槽に一旦貯めます。
