

令和2年10月（2020年10月）の工事状況 10月31日撮影



【10月の主な工事内容】

(1) 熱回収施設：ALC 工事（外壁）



(2) 熱回収施設：ランプウェイ（南側）躯体工事



(3) 熱回収施設：中央制御室 床コンクリート打設後



焼却炉を運転監視する部屋になります。

(4) 熱回収施設：ホップーステージ 床配筋工事



【10月の主な工事内容】


(5) 熱回収施設：ボイラケーシング取付け



(6) 熱回収施設：給じんシュート据付



(7) 熱回収施設：蒸気式空気予熱器据付

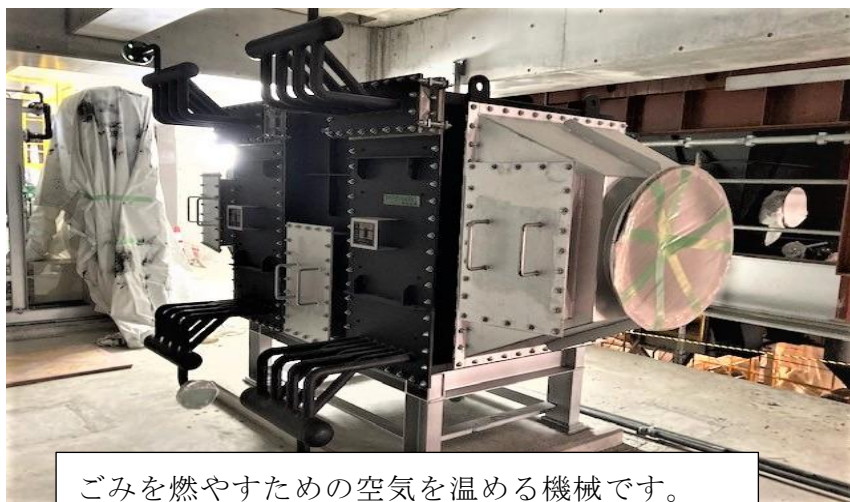

ごみを燃やすための空気を温める機械です。

(8) 熱回収施設：給じん装置据付



4本のプッシャーでごみを焼却炉に押し込みます。
