


令和2年3月（2020年3月）の工事状況 3月31日撮影



【3月の主な工事内容】

(1) リサイクル施設：1階土間配筋状況

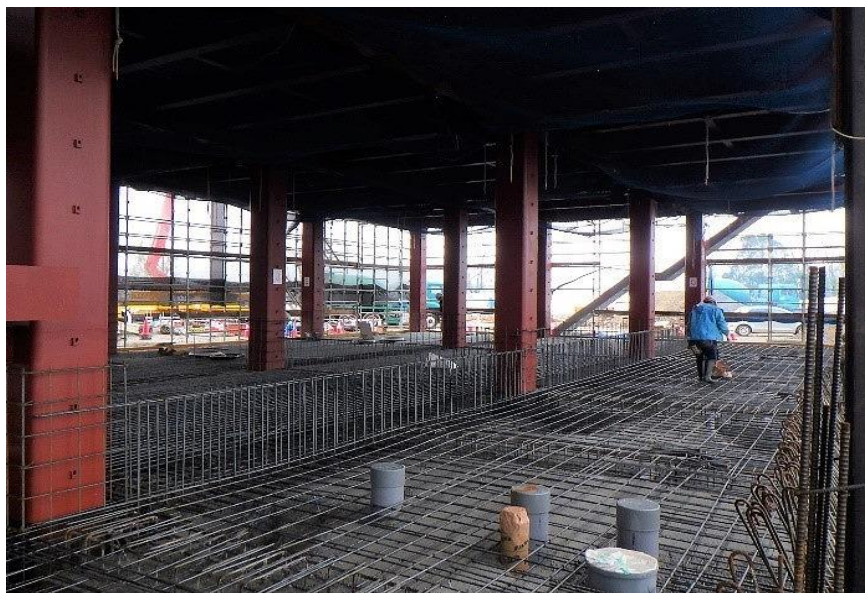

(2) リサイクル施設：2階デッキ施工状況



(3) 熱回収施設：ランプウェイ基礎パイルスタッド施工中



(4) 熱回収施設：ランプウェイ基礎型枠工事



北側ランプウェイ（傾斜路）の施工状況です。

【3月の主な工事内容】


(5) 熱回収施設：プラント架台建方中



(6) 熱回収施設：焼却炉組立中




(7) 熱回収施設：ボイラホップ据付中

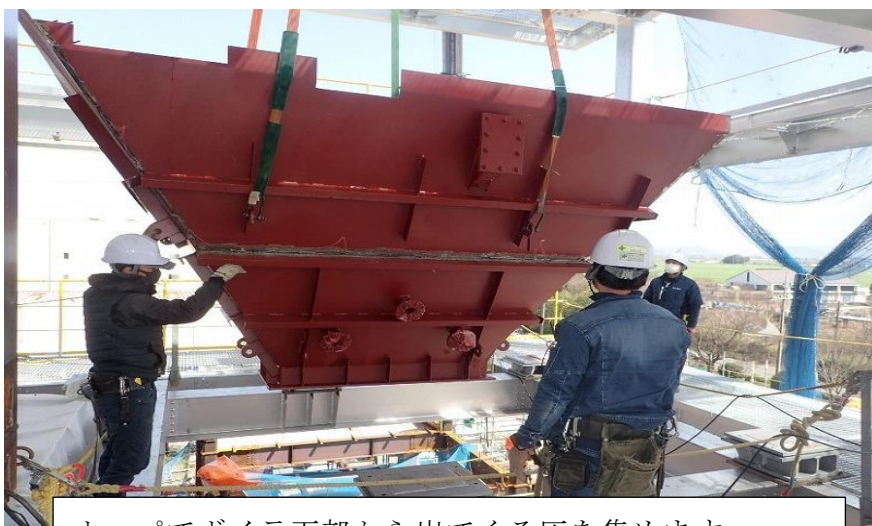

ホップでボイラ下部から出てくる灰を集めます。

(8) 熱回収施設：ボイラパネル据付中

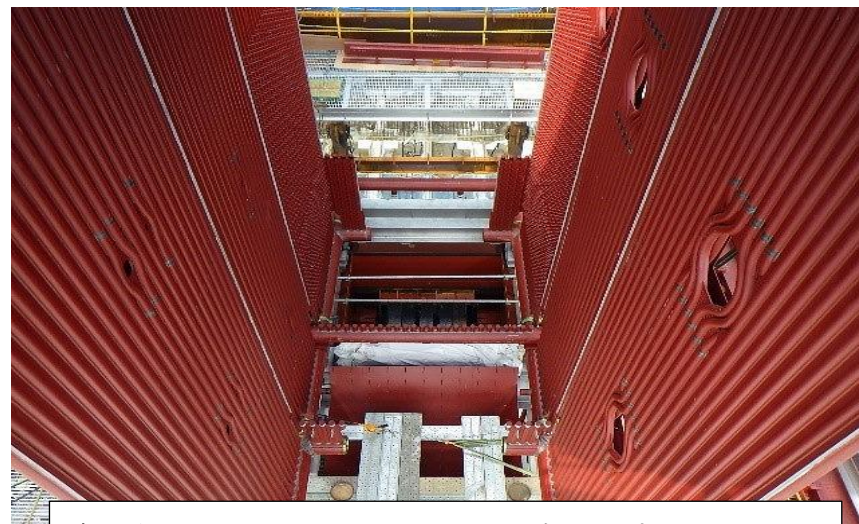

奥から1パス、2パス、3パスとなります。
